

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

**Т И П О В Ы Е  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
К А Р Т Ы**

Р А З Д Е Л 07

АЛЬБОМ 07.26

МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Цена 1р.80к.

ТТК 7.03.01; 7.03.02 и 7.06.01

**ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ  
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

**СОДЕРЖАНИЕ ТТК**

- Альбом I. Монтаж систем водопровода и канализации**
- Альбом II. Монтаж систем центрального отопления и горячего водоснабжения, а также инструменты, приспособления, средства малой механизации и вспомогательные работы**
- Альбом III. Монтаж воздушного отопления, газопровода и отопительных котельных.**

**Альбом I**

**РАЗРАБОТАНЫ**

**ПИ "Проектпромвентилиция"**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**и введены в действие  
Главпромвентилицией  
Минмонтажспецстроя СССР  
приказ № 126 от 12 ноября  
1968 г.**

**Центральный институт типовых проектов**

07.26.02

МОНТАЖ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ (БЛОКОВ) СИСТЕМ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

I. Область применения

Карта применяется при монтаже укрупненных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации в жилых зданиях.

II. Техничко-экономические показатели монтажного процесса

- |  |                |
|--|----------------|
| I. Трудоемкость монтажа блоков           | - 3,06 чел/час |
| в том числе: вертикального               | - 1,72 -"-     |
| горизонтального                          | - 1,34 -"-     |
| 2. Выработка на одного рабочего в смену: |                |
| а/ в физических величинах (штуках)       | - 2,8          |
| б) в денежном выражении (в рублях)       | - 42           |

III. Организация и технология монтажного процесса

1. На монтажный объект блоки доставляют в контейнерах (см. лист I) в количестве и сроки, предусмотренные графиком производства работ.

2. Монтаж вертикальных блоков производится после сооружения шахты, в которой блок устанавливают. Монтаж горизонтальных блоков производится до устройства перегородок уборной и ванной комнаты. В том случае, если перегородки устанавливают до монтажа блоков, то в них оставляют отверстия, через которые *блоки* должны свободно проходить.

Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации

ТТН  
7.03.01.02

1968

Пояснительная записка

Листов 1

07.26.02

3. Подготовка рабочего места для монтажа санитарно-технических блоков предусматривает:

а) освобождение места установки блоков от посторонних предметов;

б) обеспечение освещением.

4. Общий вид санитарно-технических блоков горизонтального и вертикального приведен на листе 2.

5. Подача вертикального и горизонтального блоков на место и их установку следует производить имеющимися на объекте монтажными кранами (см. лист 3).

6. График производства работ приведен на листе 8.

IV. Организация и методы труда рабочих

1. Монтаж санитарно-технических блоков выполняется звеном в составе:

слесаря-сантехники - 5 разряда.

-" - 3 "

2. Санитарно-технические блоки устанавливаются в следующей последовательности:

а) вертикальные (см. листы 4 и 5) (установка начинается с I-го этажа):

- подача блока к месту установки,

- стыковка с трубопроводами подвальной части, заделка раструба и сборка сгонов,

- заделка постоянных креплений,

- установка отвода - тройника приборного отвода

раструба.

Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации

1968

Пояснительная записка

ГТН  
7.0301.02  
Лист  
I

Проектный институт Пространствентальное	Зот. ел. инженер Мач. отвел Ра. спещ. инст	Дубин В. В.	С. Водкин С. Богдановский А. Соловьев	С. Вайс А. Соловьев Т. Юсупова
			Служба проекта Инженер Стр. техник	

07.26.02

Аналогично установка блока производится и в вышележащих этажах

б) горизонтальные (см. лист 6 и 7) (установка начинается с I-го этажа):

- подача блока к месту установки,
- установка на место и стыковка с трубопроводами вертикального блока,
- заделка раструба и сборка стенов.

Аналогично установка блока производится и в вышележащих этажах.

У. Материально-технические ресурсы

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Вертикальный блок в сборе   | - I компл. |
| 2. Горизонтальный блок в сборе | - I "      |
| 3. Отвод-тройник приборный     | - I шт.    |
| 4. Канат смоляной              | - 125 гр.  |
| 5. Лен чесанный                | - 10 "     |
| 6. Сурик на олифе              | - 10 "     |

УІ. Инструменты и приспособления

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Ключ трубный рычажный № I НКТМ 6813-39 | - I шт. |
| 2. То же, № 2                             | - I "   |
| 3. Ключ трубный рычажный № 3              | - I "   |
| 4. То же разводной до 19 мм ГОСТ 7275-62  | - I "   |
| 5. Зубило слесарное 300 мм ГОСТ 7211-54   | - 2 "   |
| 6. Конопатка 290 мм                       | - 2 "   |

Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации

ТТН  
7 03 01.02

1968


Пояснительная записка

11.68.017  
I



07.26.02

-17-

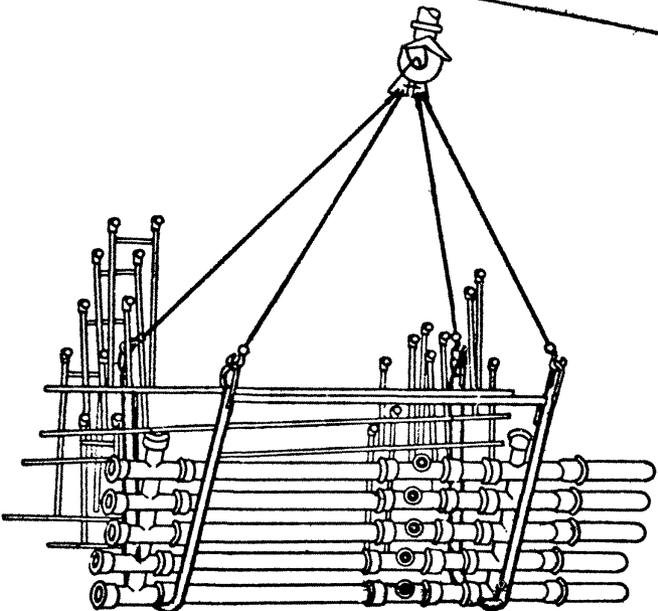


Монтаж удерживающих узлов (шпоков) систем  
вертикальных и канализационных систем

1968  
Конструктор для перевозки шпоков

Т.Т.К  
20.01.08  
Автом. рисун.  
I

07.26.02

Проектный институт Проектпротрансэнергострой	Зам. гл. инж.	Г. Вадкин	Гл. инж. проекта	Б. Вагис
	Нач. отдела Гл. специалист	С. Демуровский А. Грингауз	Рук. групп Ст. техник	А. Соловьев Т. Юшкова

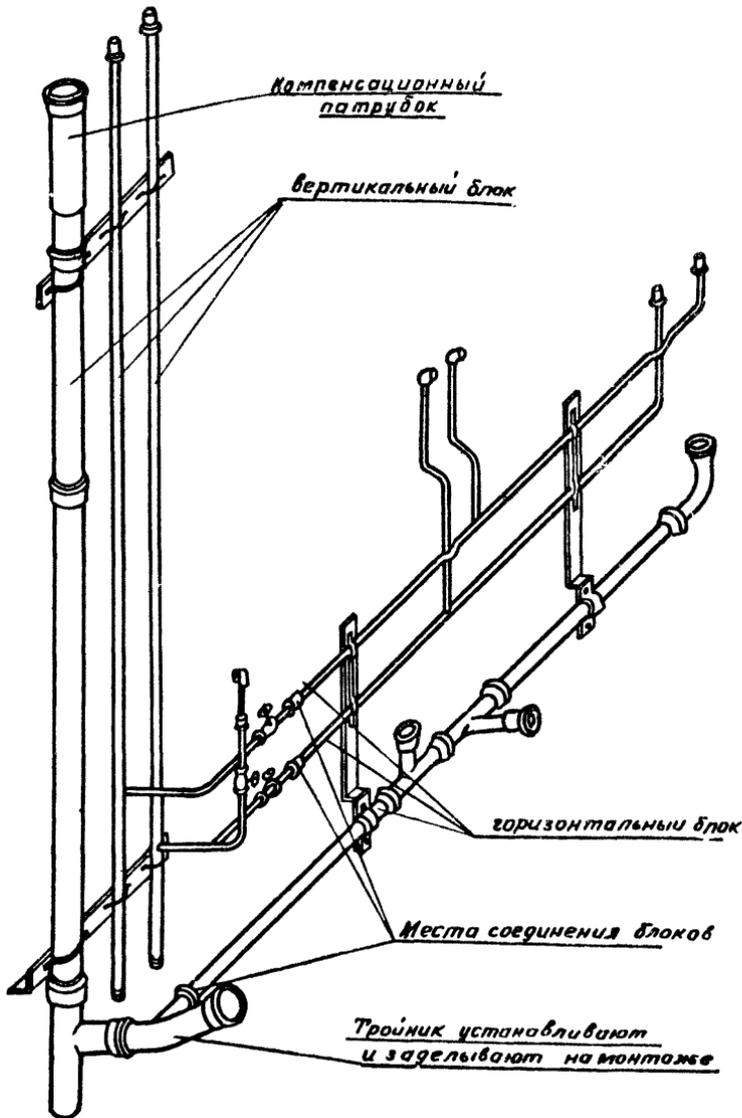

Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации


1968

Общий вид блоков в сборе

ТТК.  
7.03.01.02

Лист  
I 8

07.26.02

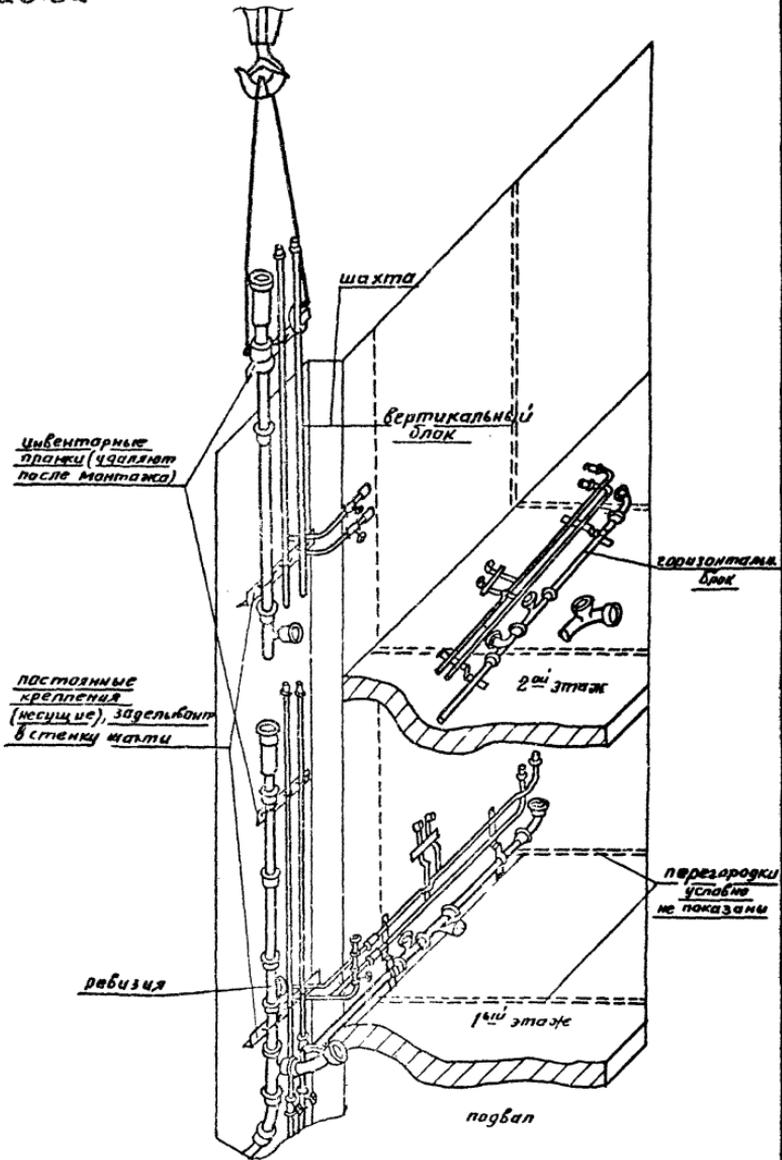


Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации


ТТК  
7.03.01.02

1968 Технологическая схема монтажа блоков

Вс. тис. I

Лист 3

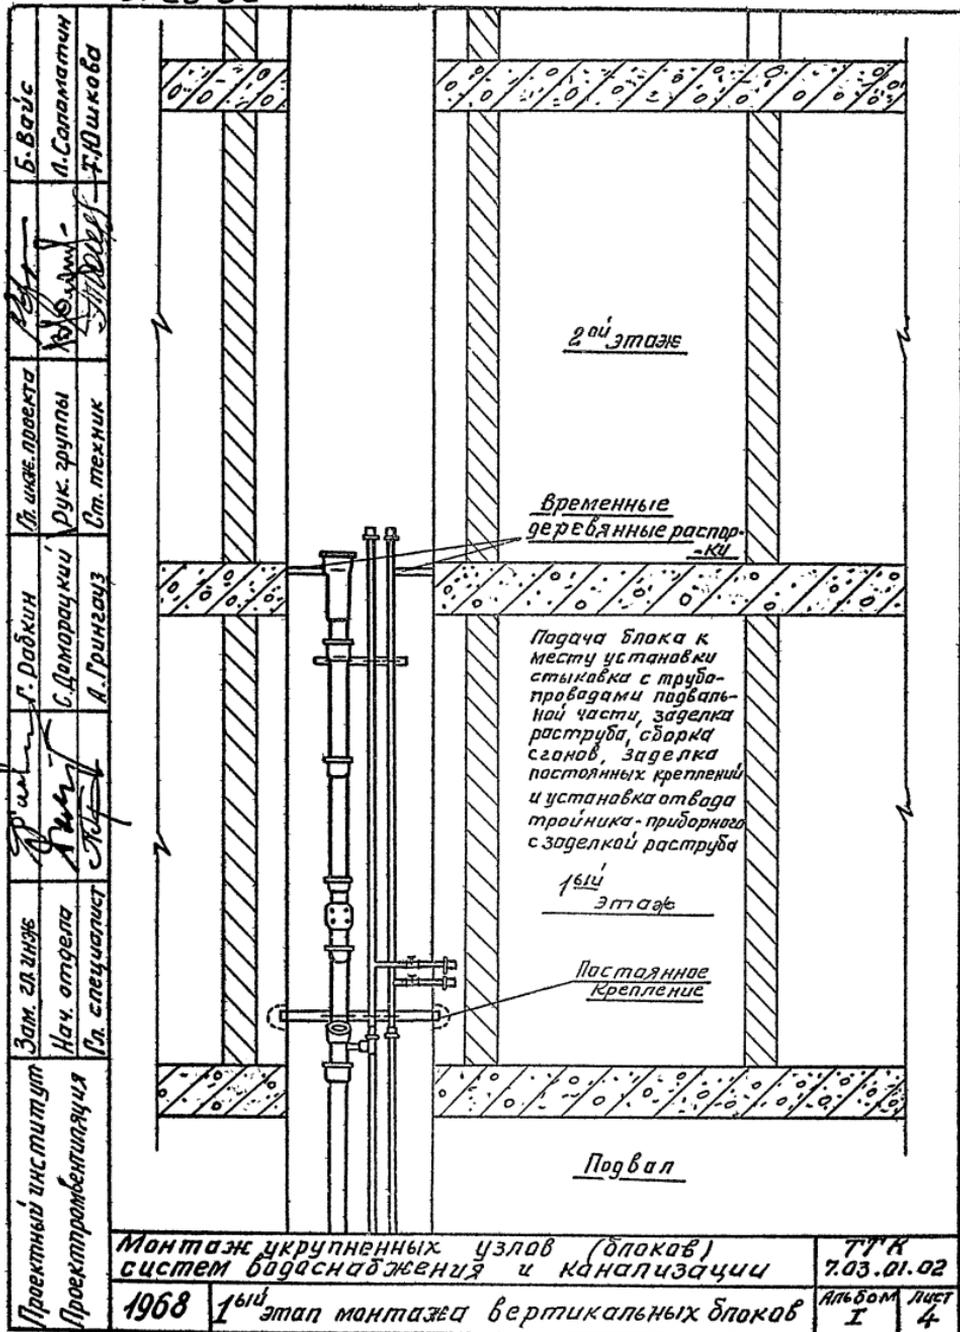

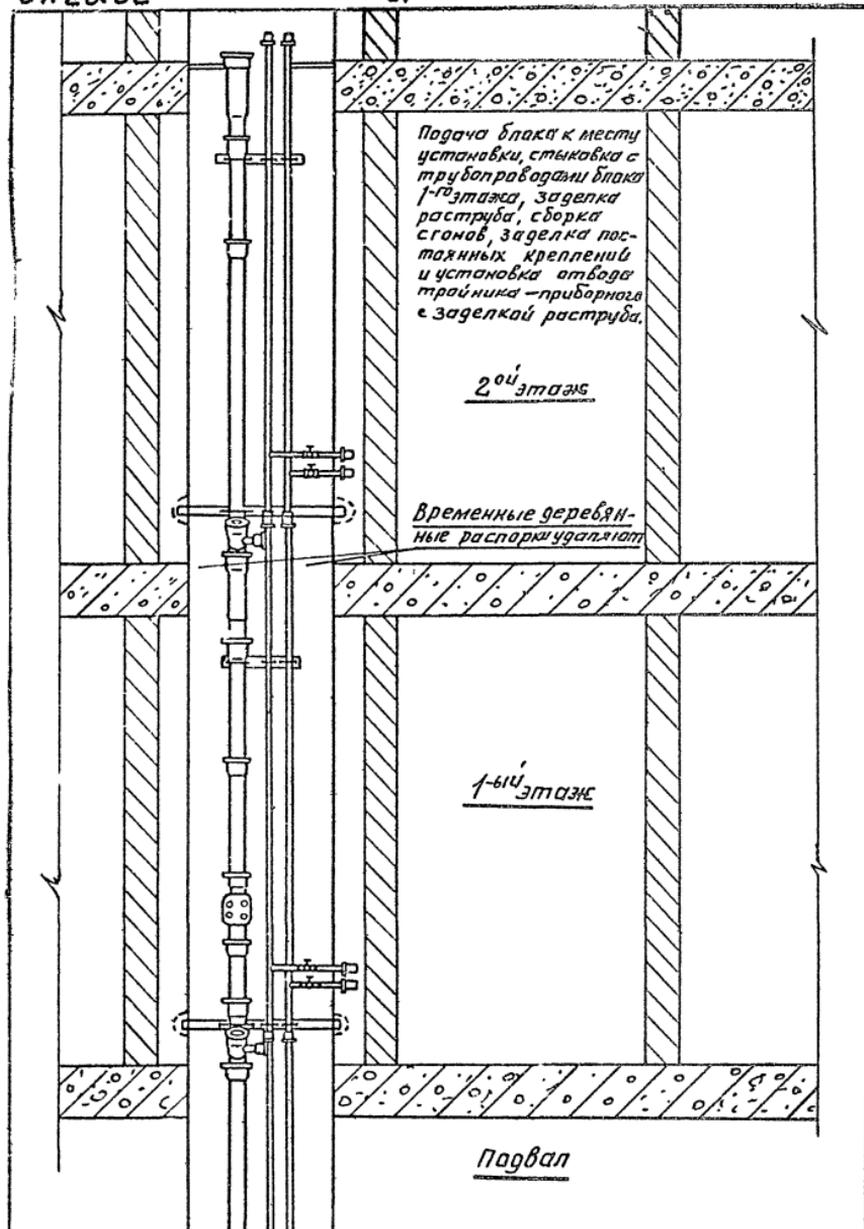


Монтаж укрупненных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации

ТТК  
7.03.01.У

1968

Последующие этапы монтажа вертикальных блоков

ЛВБ ДМ лист  
I 5

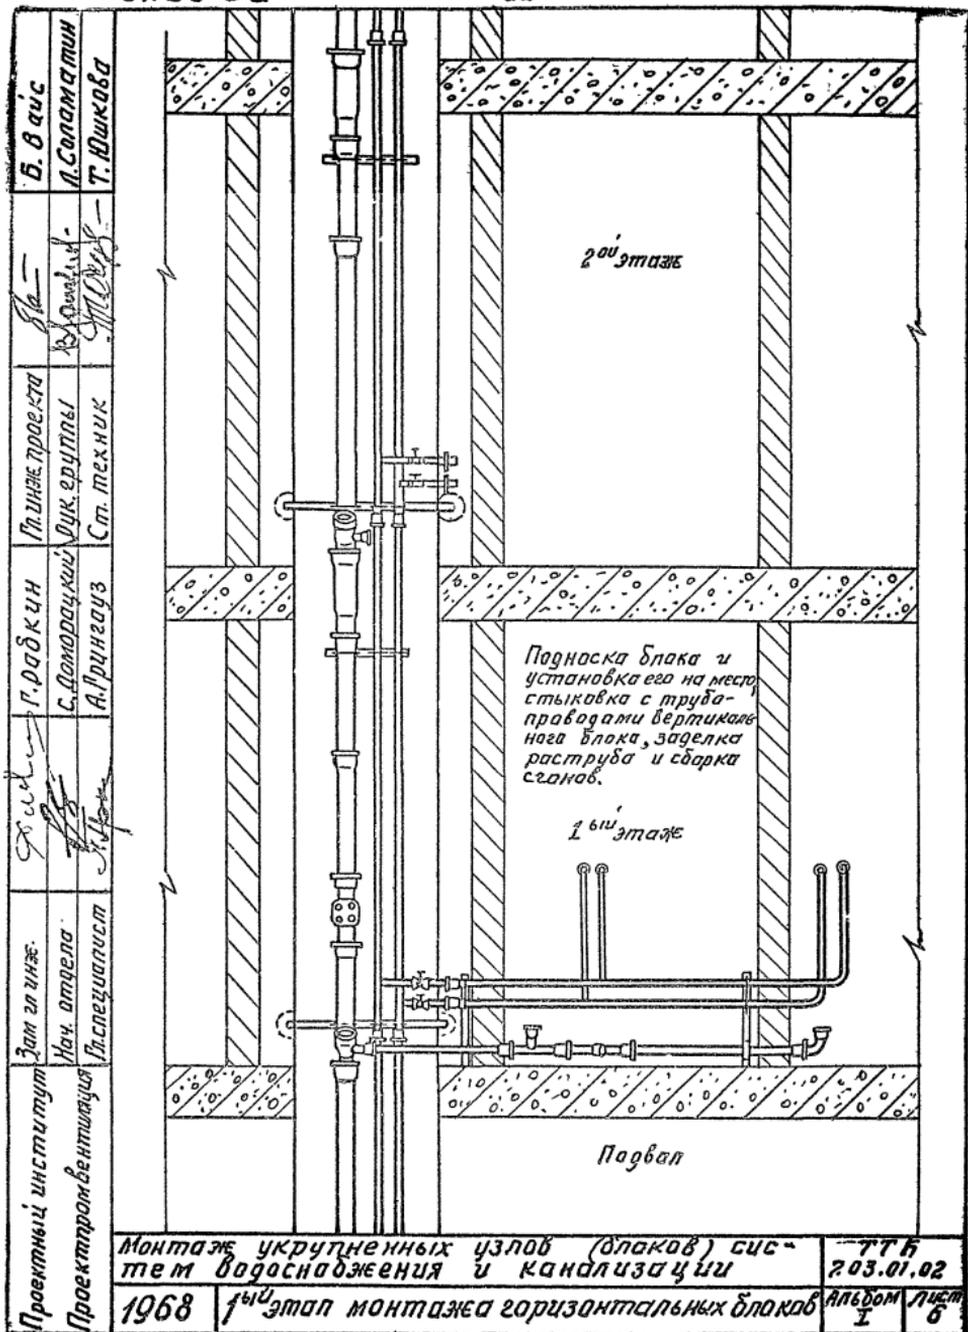

Монтаж укреплённых узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации

1968


1-й этап монтажа горизонтальных блоков

ТТБ

203.01.02

Альбом Лист

I 6

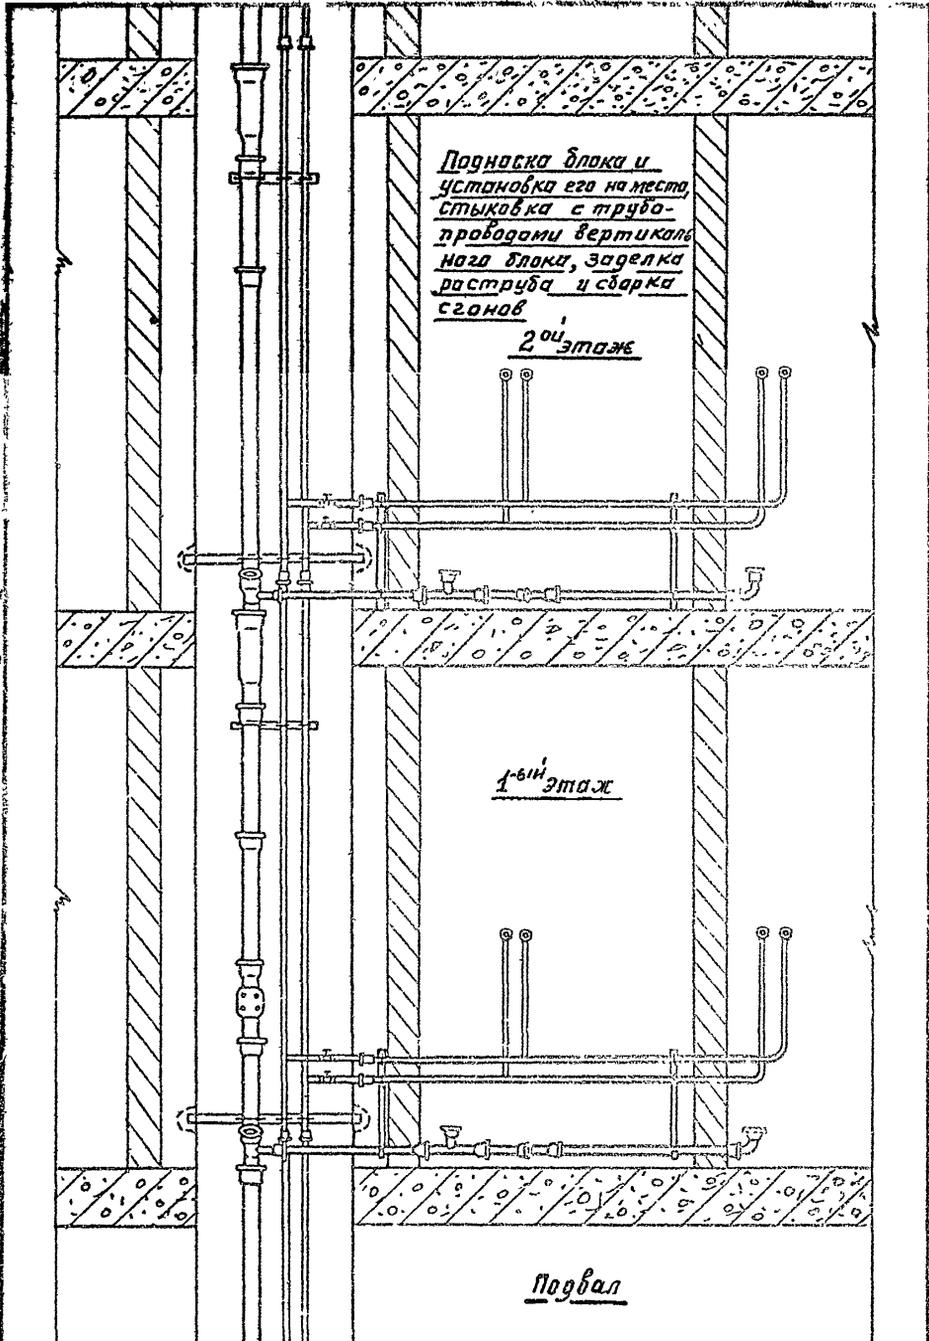

Монтаж укрепленных узлов (блоков) систем водоснабжения и канализации		ГТК 7.05.07.02
1968	Последующие этапы монтажа горизонтальных блоков	Альбом Лист I 7

Проектный институт Проектпромвентиляция	Зам. гл. инж.	<i>Г. Рабкин</i>	Г. Рабкин	Гл. инж. проекта	<i>Б. Вайс</i>	Б. Вайс
	Нач. отдела	<i>С. Доморацкий</i>	С. Доморацкий	Рук. группы	<i>Л. Саломатин</i>	Л. Саломатин
	Гл. специалист	<i>А. Срингуз</i>	А. Срингуз	Техник	<i>Л. Студенова</i>	Л. Студенова

07.26.02

1968  
Монтаж укрупненных узлов (блоков) сис-  
тем водоснабжения и канализации.  
График производства работ  
7.03.01.02  
Лист 8

№/п	Операции	Время в чел./час			
		1	2	3	4
1	Монтаж санитарно-технических блоков: а) вертикального; б) горизонтального	1,72		1,34	

**Отпечатано**  
**в Новосибирском филиале ЦИТП**  
**630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1**  

---

**выдано в печать: 17 " Окт 1977г.**  
**Заказ 2623 Тираж 1000**
